

Informacja Zarządu Elektrociepłowni Białystok S.A. dotycząca przebiegu inwestycji w latach 2001-2008 – 08.05.2008

1. Plan i wykonanie inwestycji 2000 -2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Suma 2000-2005	2006	2007	2008	Suma 2000-2008
Plan z 2000 roku (materiały dla Inwestorów)	30 402 710	31 495 000	24 835 000	13 215 000	17 390 000	19 890 000	137 227 710	-	-	-	137 227 710
Plan rzeczywisty (zatwierdzony przez RN)	30 442 710	29 925 455	36 381 753	49 442 500	18 055 000	24 982 000	189 229 418	41 948 000	74 590 350	115 539 650	421 307 418
Wykonanie	24 949 285	23 690 808	27 772 243	48 611 388	14 766 396	17 374 002	157 164 122	41 970 668	60 341 681		259 476 471

Uzasadnienie rozbieżności:

Rok 2001

Budowa turbiny kondensacyjnej:

plan - 5 350 000 PLN '

wykonanie- 870 000PLN

Rok 2002

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Wojciech plan

- 4 200 000 PLN wykonanie - 246 000 PLN

Zagospodarowania ścieków i odpadów

plan - 700 000 PLN wykonanie - 0
PLN

Rok 2004

Budowa rurociągu wody z Pietrasz

plan - 3 500 000 PLN

wykonanie- 286 000 PLN

Dostosowanie chłodni OXP do współpracy z TZ4
plan-1 150 000 PLN wykonanie - 145 000
PLN


Rok 2005

Modernizacja młynów K8
plan-1010 000 PLN
wykonanie - 59 000 PLN

Modernizacja Elektro filtra K8
plan - 500 000 PLN
wykonanie- 95 000PLN



Uwaga ogólna dotycząca inwestycji roku 2005:

Wykonanie jest niższe z powodu odstąpienia od realizacji pewnych zadań związanych z automatyzacją wobec nie podpisania kontraktu z firmą Honeywell w planowanym terminie tj. listopad 2005. Podpisanie nastąpiło dopiero w marcu 2006 z powodu wykorzystania istniejących procedur zamówień publicznych przez firmy których oferty zostały odrzucone do wniesienia nieuzasadnionych protestów





2. Wykonanie planu inwestycyjnego z podziałem na grupy

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Grupa I	Modernizacja/Automatyzacja					9 531 047	2 434 938	23 789 865	34 373 554	20 291 084
Grupa II	Odtworzeniowe					857 287	5 890 696	11 930 661	10 013 336	12 502 000
Grupa III	Ochrona Środowiska					482 948	7 911 905	833 415	9 211 232	79 574 566
Grupa IV	Inne					3 487 144	1 057 325	2 674 099	2 997 989	2 872 000
Grupa V	Możliwości					407 970	79 138	2 742 629	3 745 569	300 000
	SUMA	24 949 285	22 211 533	27 772 243	48 611 388	14 766 396	17 374 002	41 970 669	60 341 680	115 539 650

Inwestycje 2000-2008

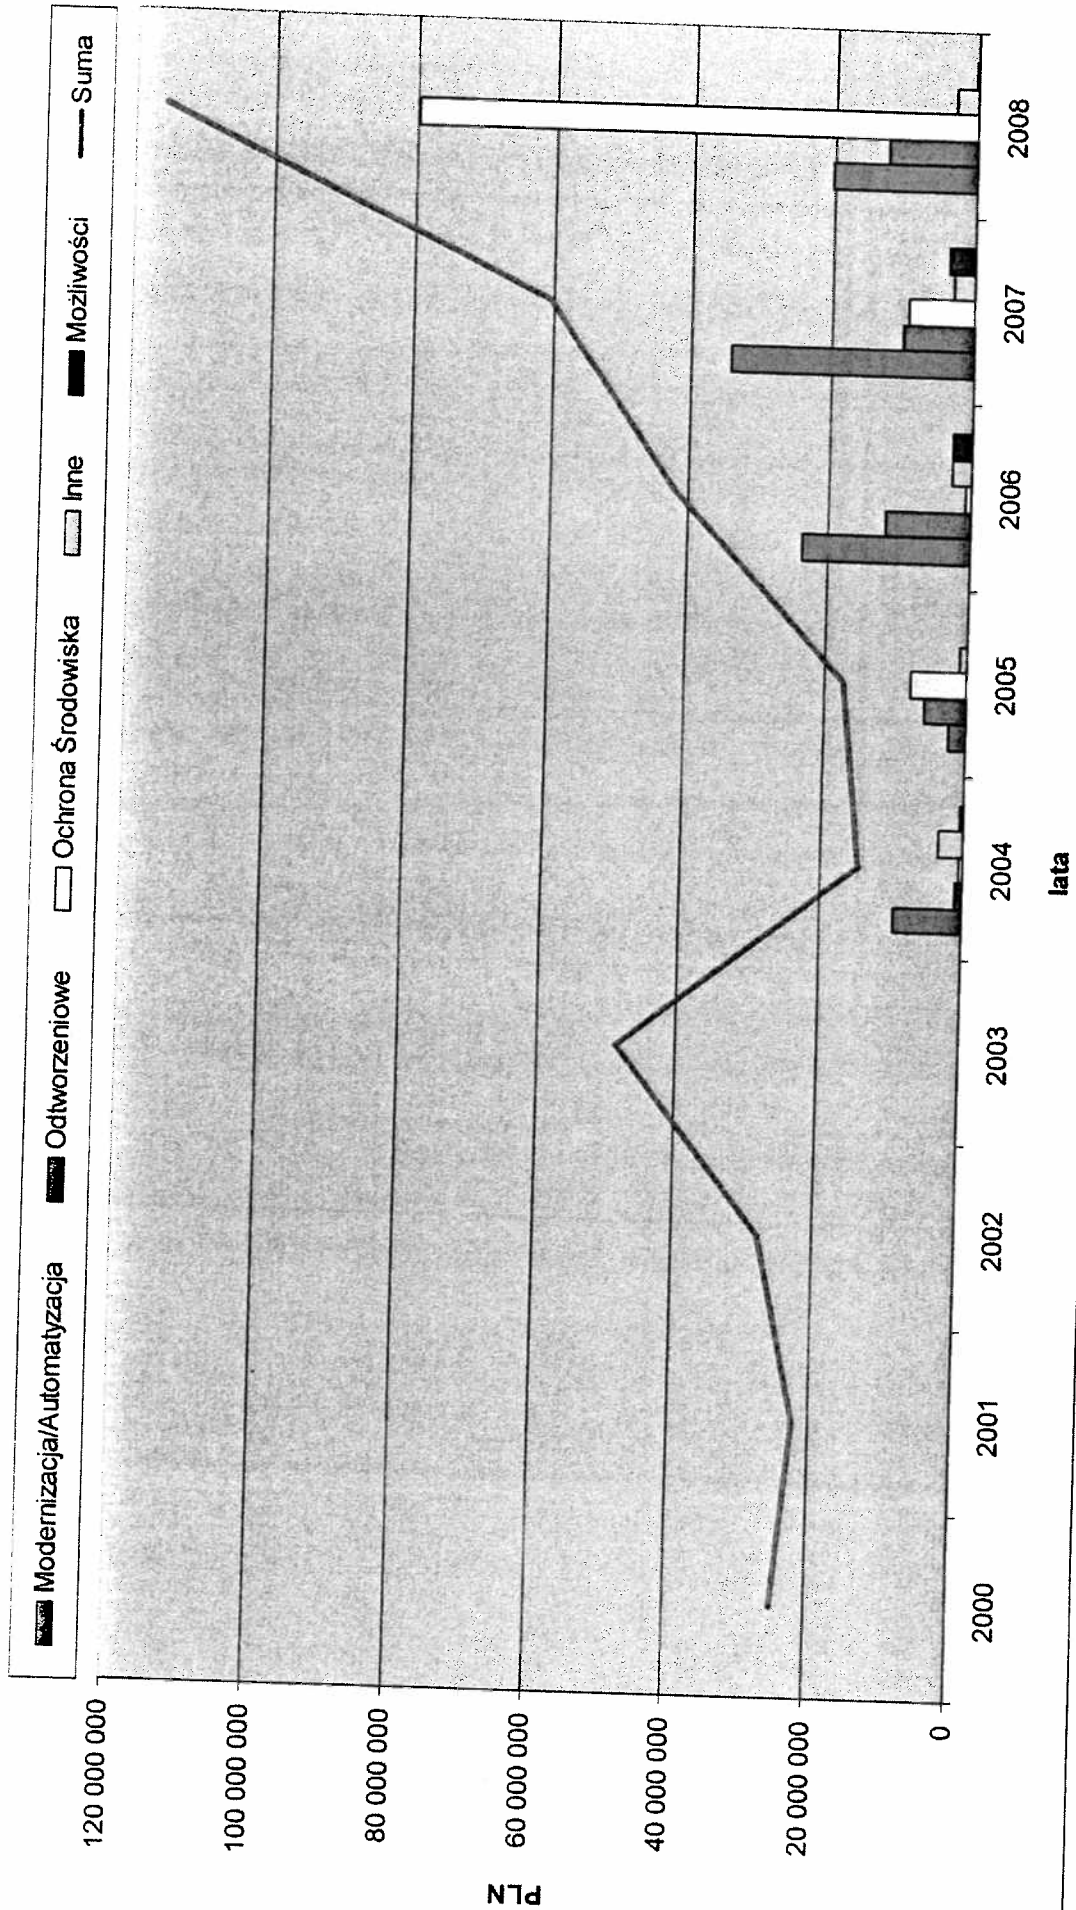



3. Podsumowanie

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	SUMA
Suma PLN	22 211 533	27 772 243	48 611 388	14 766 396	17 374 002	41 970 668	60 341 681	115 539 650	348 587 560
Wartości skumulowane	22 211 533	49 983 775	98 595 163	113 361 559	130 735 561	172 706 230	233 047 910	348 587 560	

Nakłady inwestycyjne 2001-2008 [PLN]

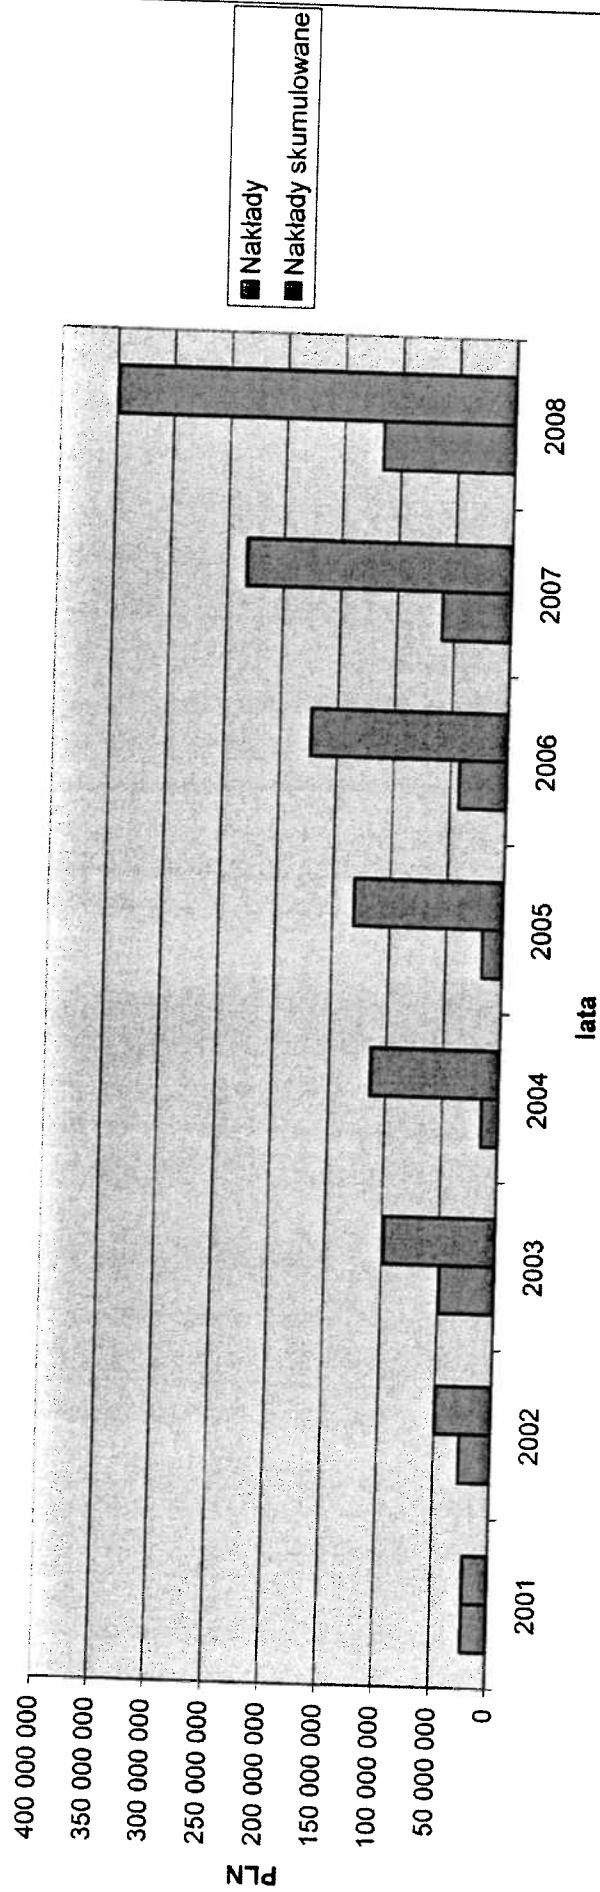

[Handwritten signature]

4. Inwestycje kapitałowe zewnętrzne

Projekt	Kwota oferty [PLN]	Rok	Powód odstąpienia
EC Radow	30 500 000	2001/2002	Niechętna postawa władz miejskich powodująca dużą niepewność dotyczącą
OPEC Grudziądz	13 000 000	2002	możliwości sprzedaży energii cieplnej w przyszłości
EC Kraśnik	10 984 800	2002	Decyzja właściciela o odstąpieniu od prywatyzacji
MPEC Międzyrzecz Podlaski	713 000	2003	Wysokie potrzeby nakładów inwestycyjnych bez możliwości zabezpieczenia sprzedaży energii
			Oferta złożona ale nie przyjęta

ELEKTROCIĘPLOWNIA BIALYSTOK
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 BIAŁYSTOK
tel. 085 654 95 00, fax 085 654 95 14

ELEKTROCIĘPLOWNIA BIALYSTOK S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. STRATEGII I ROZWOJU
dr inż. Andrzej Adamowski

ELEKTROCIĘPLOWNIA BIALYSTOK S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. FINANSOWYCH
DYREKTOR GENERALNY
mgr Piotr Janicki
dr inż. Andrzej Paweł Schneider
